



PROJETO IPOJUCA CUIDA +

RELATÓRIO ANALÍTICO
AGOSTO 2024





METAS DO PROJETO




- 1ª – 69 Profissionais Contratados
- 2ª – 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções
- 3ª – 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado
- 4ª – Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto
- 5ª – Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco
- 6ª – Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades
- 7ª – 02 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais
- 8ª – 12.000 procedimentos realizados
- 9ª – 1.600 ações coletivas
- 10ª – 4.200 exames de USG realizados



METAS DO PROJETO



- 11ª – 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial
- 12ª – 1.400 consultas médicas especializadas
- 13ª – 100 pequenas cirurgias de pele
- 14ª – 01 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA
- 15ª – 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas
- 16ª – 8 relatórios analíticos do projeto emitidos

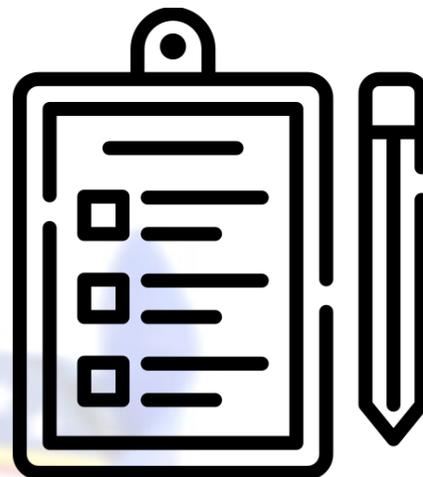



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



Status: **ALCANCADA** ✓



Ações Projetadas: Seleção de Profissionais



Período Previsto: 01/04/2024 a 30/05/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** ✓



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



ETAPAS PROGRAMADAS

Elaborar e Divulgar Editais de Seleção: **CONCLUÍDA** ✓

Realizar Processos Seletivos Conforme Editais: **CONCLUÍDA** ✓

Realizar Chamamento e Contratação dos Profissionais:
CONCLUÍDA ✓



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **META ALCANÇADA**



ENCAMINHAMENTOS
ALCANÇADA

PRODUZIDOS: **META**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
Contrato Firmados com Colaboradores.



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



||||| Status das Metas : **CONCLUÍDA** ✓



Ações Projetadas: Capacitação dos Profissionais



Período Previsto: 01/05/2024 a 16/07/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** ✓



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar capacitação dos agentes de cadastro: **CONCLUÍDA** ✓

Realizar capacitação dos profissionais das UMA e das equipes multiprofissionais: **CONCLUÍDA** ✓



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **META ALCANÇADA.**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **META ALCANÇADA.**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Atas de frequência das capacitações dos agentes de cadastro e dos profissionais das UMA e das equipes multiprofissionais.



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Cadastramento de usuários e estratificação de risco.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **ATRASADA**





3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100%
desses indivíduos com risco estratificado



ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar distribuição territorial dos Agentes de cadastro:
CONCLUÍDA 

Realizar cadastramento e estratificação de risco: **ATRASADA**





3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Grande redução de áreas e microáreas liberadas para cadastro no projeto, impactando na capacidade de alcance da meta



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Após alguns estudos realizados pelos consultores, e considerando que a SMS finalmente definiu as áreas e microáreas liberadas para cadastro pelo projeto, resultando em grande redução da estimativa populacional a ser cadastrada, a diretoria da Associação Filhos de Ipojuca decidiu pela solicitação de termo aditivo para ajuste de meta, de forma a reduzir para 5.000 cadastros, conforme relatório técnico produzido



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatório parcial de cadastros realizados.



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



Status das Metas: **CONCLUÍDA** 



Ações Projetadas: Articulação com equipamentos sociais dos territórios.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** 



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar visitas técnicas aos territórios para mapear atores e equipamentos sociais para possíveis parcerias: **CONCLUÍDA** ✓

Formalizar parcerias com equipamentos sociais, definindo as responsabilidades de cada parceiro: **CONCLUÍDA** ✓



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



**DIFICULDADES
ALCANÇADA.**

ENCONTRADAS:

META



**ENCAMINHAMENTOS
ALCANÇADA.**

PRODUZIDOS:

META



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
Termos de parceria com equipamentos sociais dos territórios.



5ª META: Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Construção dos protocolos assistenciais e projetos terapêuticos para definição da agenda de atividades assistenciais.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **ATRASADA**





5ª META: Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco.



ETAPAS PROGRAMADAS

Emitir relatório ao fim do cadastramento para identificação dos usuários de alto risco: **ATRASADA** 

Elaboração dos protocolos assistenciais para cada grupo e condição prioritária: **ATRASADA** 

Elaborar projetos terapêuticos individuais para cada usuário de alto risco identificado: **ATRASADA** 



5ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Atraso na finalização do cadastramento e estratificação de risco. Como a presente ação depende da evolução daquela anterior, houve atraso significativo.



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Encaminhamentos produzidos para lidar com o atraso no cadastramento e estratificação de risco.



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

1. Relatórios parcial de usuários de alto risco identificado por território;
2. Protocolos assistenciais construídos no período



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Agendamento de usuários para implementação dos projetos terapêuticos.



Período Previsto: 01/07/2024 a 12/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar agendas semanais dos atendimentos das UMA nos territórios durante todo o período do projeto: **ATRASADA**

Agendar os atendimentos que serão possíveis para os usuários de alto risco considerando as agendas semanais nos territórios: **EM ANDAMENTO**



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



DIFICULDADES ENCONTRADAS:



1. As agendas semanais estão finalizadas até setembro, sendo que não foi possível fazer todas as semanas pois havia a necessidade da SMS definir a entrada do território de Porto de Galinhas;
2. Como houve atraso na finalização do cadastro e estratificação de risco, os agendamentos para os usuários de maior risco não foi iniciado



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Solicitação à SMS de celeridade para definição da entrada ou não do território de Porto de Galinhas;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Agenda semanais de Setembro e Outubro;





7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Divulgação dos atendimentos e ações nos territórios.



Período Previsto: 08/07/2024 a 06/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



ETAPAS PROGRAMADAS

Elaborar conteúdos a serem veiculados nas redes sociais e em carros de som/rádios: **CONCLUÍDO** ✓

Realizar veiculação dos conteúdos nas redes sociais e carros de som/rádios: **EM ANDAMENTO**



7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o momento, não foram necessários;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

1. Relatório com postagens realizadas nas redes sociais para cada semana de atendimento;
2. Relatório descritivo das ações de divulgação em carros de sim/rádios para cada semana de atendimento;



8ª META: 12.000 procedimentos realizados



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



8ª META: 12.000 procedimentos realizados



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **ATRASADA** ⌚

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO**



8ª META: 12.000 procedimentos realizados



DIFICULDADES ENCONTRADAS:



1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado;



2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos cirúrgicos ainda está sendo estudada



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES



9ª 1.600 ações coletivas



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



9ª 1.600 ações coletivas



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **ATRASADA** ⌚

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO**



DIFICULDADES ENCONTRADAS:



1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado;



2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos cirúrgicos ainda está sendo estudada



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES



10ª 4.200 exames de USG realizados.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



10ª 4.200 exames de USG realizados.



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **ATRASADA** ⌚

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO**



10ª 4.200 exames de USG realizados.



DIFICULDADES ENCONTRADAS:



1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado;

2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos cirúrgicos ainda está sendo estudada



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **ATRASADA** ⌚

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO**



11ª - 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial.



DIFICULDADES ENCONTRADAS:



1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado;



2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos cirúrgicos ainda está sendo estudada



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES



12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **ATRASADA** ⌚

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO**



12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



DIFICULDADES ENCONTRADAS:



1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado;

2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos cirúrgicos ainda está sendo estudada



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **ATRASADA** ⌚

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO**



DIFICULDADES ENCONTRADAS:



1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado;



2. O perfil das consultas médicas especializadas foi definido (cardiologia, pediatria, ginecologia e psiquiatria), sendo que a contratação de profissionais foi realizada e o início dos trabalhos programados para a competência de setembro. A demanda de pequenos procedimentos cirúrgicos ainda está sendo estudada



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Diálogo com profissionais de saúde das equipes das UMA e e-multi sobre a necessidade de melhoria do registro de procedimentos, com criação de um sistema eletrônico para facilitar tal registro;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Emissão de relatórios operacionais das atividades assistenciais.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



ETAPAS PROGRAMADAS

Cadastrar as UMA no CNES: **ATRASADA** 

Emitir relatórios diários de produção ambulatorial: **ATRASADA** 

Alimentar SIA-SUS com produção diária: **ATRASADA** 



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Morosidade no processo burocrático para o registro da filial da Rede Vhida no cartório local;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Realização de monitoramento do setor Jurídico da Rede Vhida junto ao cartório local para atender os pleitos e cobrar maior agilidade no registro;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatórios operacionais dos boletins diários de produção ambulatorial, conforme modelo do SIA/SUS;



15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Reuniões de programação e monitoramento do projeto.



Período Previsto: 01/05/2024 a 30/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar reunião ordinária mensal da Comissão de Monitoramento para acompanhamento do projeto e prestações de contas parciais: **EM ANDAMENTO**



15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não foram registradas novas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Articulações com o gabinete da Secretária de Saúde para tornar mais célere a recomposição da Comissão de Monitoramento;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da Reunião Realizada.



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Emissão de relatórios analíticos do projeto.



Período Previsto: 01/05/2024 a 30/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



ETAPAS PROGRAMADAS

Emitir relatório analítico mensal com a síntese do desenvolvimento do projeto: **EM ANDAMENTO**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta.



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o momento, não foram necessários.



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.
