



PROJETO IPOJUCA CUIDA +

RELATÓRIO ANALÍTICO
ABRIL 2024





METAS DO PROJETO




- 1ª – 69 Profissionais Contratados
- 2ª – 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções
- 3ª – 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado
- 4ª – Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto
- 5ª – Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco
- 6ª – Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades
- 7ª – 02 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais
- 8ª – 12.000 procedimentos realizados
- 9ª – 1.600 ações coletivas
- 10ª – 4.200 exames de USG realizados



METAS DO PROJETO



- 11ª – 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial
- 12ª – 1.400 consultas médicas especializadas
- 13ª – 100 pequenas cirurgias de pele
- 14ª – 01 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA
- 15ª – 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas
- 16ª – 8 relatórios analíticos do projeto emitidos

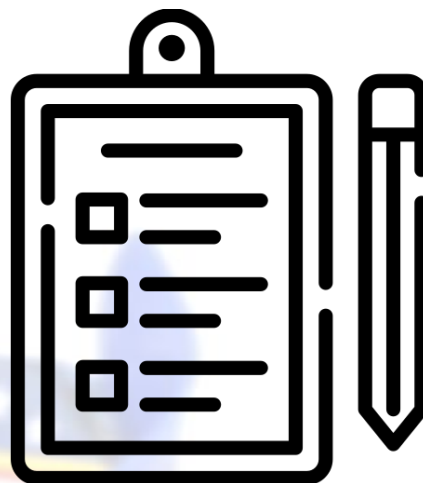



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



Status: No Ritmo Esperado



Ações Projetadas: Seleção de Profissionais



Período Previsto: 01/04/2024 a 30/05/2024



Status das Ações: A Iniciar



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



ETAPAS PROGRAMADAS

Elaborar e Divulgar Editais de Seleção: **EM ANDAMENTO**

Realizar Processos Seletivos Conforme Editais: **A INICIAR**

Realizar Chamamento e Contratação dos Profissionais: **A INICIAR**



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



DIFICULDADES ENCONTRADAS:

Diferença significativa encontrada entre a estimativa da área técnica da SMS acerca da quantidade de pessoas em cada território descoberto e os dados oficiais constantes no E-SUS.



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:

Reunião com a comissão de monitoramento e avaliação para alinhamento acerca dos territórios a serem trabalhados pelo projeto.



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.





2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



||||| Status das Metas: No Ritmo Esperado



Ações Projetadas: Capacitação dos Profissionais



Período Previsto: 01/05/2024 a 16/07/2024



Status das Ações: A Iniciar



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar capacitação dos agentes de cadastro: **A INICIAR**

Realizar capacitação dos profissionais das UMA e das equipes multiprofissionais: **A INICIAR**



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100%
desses indivíduos com risco estratificado



||| ||| ||| Status das Metas: No Ritmo Esperado



Ações Projetadas: Cadastramento de
usuários e estratificação de risco.



Período Previsto: 01/06/2024 a
30/07/2024



Status das Ações: **A Iniciar**



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100%
desses indivíduos com risco estratificado



ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar distribuição territorial dos Agentes de cadastro: **EM ANDAMENTO**

Realizar cadastramento e estratificação de risco: **A INICIAR**



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



DIFICULDADES ENCONTRADAS:

Diferença significativa encontrada entre a estimativa da área técnica da SMS acerca da quantidade de pessoas em cada território descoberto e os dados oficiais constantes no E-SUS.



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:

Reunião com a comissão de monitoramento e avaliação para alinhamento acerca dos territórios a serem trabalhados pelo projeto, com consequente definição da distribuição das vagas dos agentes de cadastro do território.



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Aguardando alcance da meta, mesmo que parcial.





4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



||| ||| ||| Status das Metas: No Ritmo Esperado



Ações Projetadas: Articulação com equipamentos sociais dos territórios.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **A Iniciar**



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar visitas técnicas aos territórios para mapear atores e equipamentos sociais para possíveis parcerias: **A INICIAR**

Formalizar parcerias com equipamentos sociais, definindo as responsabilidades de cada parceiro: **A INICIAR**



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





5ª META: Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco.



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Construção dos protocolos assistenciais e projetos terapêuticos para definição da agenda de atividades assistenciais.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



5ª META: Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco.



ETAPAS PROGRAMADAS

Emitir relatório ao fim do cadastramento para identificação dos usuários de alto risco: **A INICIAR**

Elaboração dos protocolos assistenciais para cada grupo e condição prioritária: **A INICIAR**

Elaborar projetos terapêuticos individuais para cada usuário de alto risco identificado: **A INICIAR**



5ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Agendamento de usuários para implementação dos projetos terapêuticos.



Período Previsto: 01/07/2024 a 12/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar agendas semanais dos atendimentos das UMA nos territórios durante todo o período do projeto: **A INICIAR**

Agendar os atendimentos que serão possíveis para os usuários de alto risco considerando as agendas semanais nos territórios: **A INICIAR**



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



||||| Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Divulgação dos atendimentos e ações nos territórios.



Período Previsto: 08/07/2024 a 06/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



ETAPAS PROGRAMADAS

Elaborar conteúdos a serem veiculados nas redes sociais e em carros de som/rádios: **A INICIAR**

Realizar veiculação dos conteúdos nas redes sociais e carros de som/rádios: **A INICIAR**



7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





8ª META: 12.000 procedimentos realizados



||||| Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



8ª META: 12.000 procedimentos realizados



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: [A INICIAR](#)

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: [A INICIAR](#)

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica [A INICIAR](#)

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: [A INICIAR](#)

Realizar atendimentos em atenção básica: [A INICIAR](#)

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: [A INICIAR](#)



8ª META: 12.000 procedimentos realizados



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





9ª 1.600 ações coletivas



||||| Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



9ª 1.600 ações coletivas



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: [A INICIAR](#)

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: [A INICIAR](#)

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica [A INICIAR](#)

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: [A INICIAR](#)

Realizar atendimentos em atenção básica: [A INICIAR](#)

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: [A INICIAR](#)



9ª 1.600 ações coletivas



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





10ª 4.200 exames de USG realizados.



||||| Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



10ª 4.200 exames de USG realizados.



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **A INICIAR**

Realizar atendimentos em atenção básica: **A INICIAR**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **A INICIAR**



10ª 4.200 exames de USG realizados.



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





11ª - 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial.



||||| Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **A INICIAR**

Realizar atendimentos em atenção básica: **A INICIAR**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **A INICIAR**



11ª - 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial.



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



||||| Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: [A INICIAR](#)

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: [A INICIAR](#)

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica [A INICIAR](#)

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: [A INICIAR](#)

Realizar atendimentos em atenção básica: [A INICIAR](#)

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: [A INICIAR](#)



12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





||||| Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **A INICIAR**

Realizar atendimentos em atenção básica: **A INICIAR**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **A INICIAR**



ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica **A INICIAR**

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **A INICIAR**

Realizar atendimentos em atenção básica: **A INICIAR**

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **A INICIAR**



13ª - 100 Pequenas Cirurgias de Pele.



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Emissão de relatórios operacionais das atividades assistenciais.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



ETAPAS PROGRAMADAS

Cadastrar as UMA no CNES: **A INICIAR**

Emitir relatórios diários de produção ambulatorial: **A INICIAR**

Alimentar SIA-SUS com produção diária: **A INICIAR**



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Reuniões de
programação e monitoramento do
projeto.



Período Previsto: 01/05/2024 a
30/12/2024



Status das Ações: **A INICIAR**



15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar reunião ordinária mensal da Comissão de Monitoramento para acompanhamento do projeto e prestações de contas parciais: **A INICIAR**



15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **A INICIAR**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **A INICIAR**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: **A INICIAR**





 Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Emissão de relatórios analíticos do projeto.



Período Previsto: 01/05/2024 a 30/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**



16ª - 8 relatórios analíticos do projeto emitidos



ETAPAS PROGRAMADAS

Emitir relatório analítico mensal com a síntese do desenvolvimento do projeto: **EM ANDAMENTO**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta.



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Até o momento, não foram necessários.



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.
